

اجتماع الانطلاق • Project Kickoff



NESTHIRE

Hiring Intelligence. Real Outcomes.

أنظمة توظيف تتعلّم من الأدلة والنتائج... لا من الافتراضات الثابتة.

Hiring System Intelligence — طبقة ذكاء فوق أنظمة التوظيف الحالية،
تربط قرارات التعيين بنتائج ما بعد التوظيف وتعاير العملية باستمرار.

Product Vision • Team Alignment • Execution Plan



لماذا هذا المشروع؟

Problem Statement

كثير من المؤسسات لا تملك آلية موثوقة تختبر
بها: هل معايير التوظيف التي تستخدمها تتنبأ
فعلاً بنجاح الموظف في دوره؟

السؤال المعتاد في السوق

من هو أفضل مرشح؟

Candidate-first



سؤالنا

ما الذي يعمل فعلاً داخل نظام التوظيف...
وما الذي يجب معايرته؟

System-first

Quality of Hire: لا يوجد له تعريف عالمي موحد



البيانات موزعة بين ATS و HRIS وأنظمة التقييم والأداء



ارتباط Signal بالنتيجة لا يعني أنه سببها





أين يتعطل نظام التوظيف اليوم؟



01

بيانات مجزأة

إشارات التوظيف ونتائج الموظفين موزعة بين ATS و HRIS وأنظمة التقييم والأداء.



02

حلقة غير مغلقة

صعوبة ربط المرشح بالموظف، وبنتيجته الفعلية بعد التوظيف.



03

تغييرات بلا قياس

تتغير Rubrics المقابلات والتقييمات دون معرفة إن أحدثت فرقاً في النتائج.



04

استنتاجات هشة

Cohorts صغيرة، وعوامل مثل المدير والـ Onboarding، وارتباط يُقرأ كأنه سببية.



النتيجة: بيانات كثيرة... دون Insight قابل للتنفيذ، وتغييرات في التوظيف لا يُقاس أثرها.



فكرتنا في دقيقة

الوحدة الأساسية للتحليل: Role + Cohort + Signal + Outcome



Positioning: طبقة Intelligence محايدة فوق ATS/HRIS والأنظمة الحالية – Vendor-agnostic، وليست بديلًا عنها.

لا يتخذ قرار التوظيف النهائي

ليس AI Recruiter

ليس CV Screener

ليس ATS جديدًا




حلقة واحدة تتعلّم مع كل دفعة توظيف

الدليل ← القرار ← النتيجة ← المعايير ← التغيير ← الدفعة التالية





المستخدمون المستهدفون

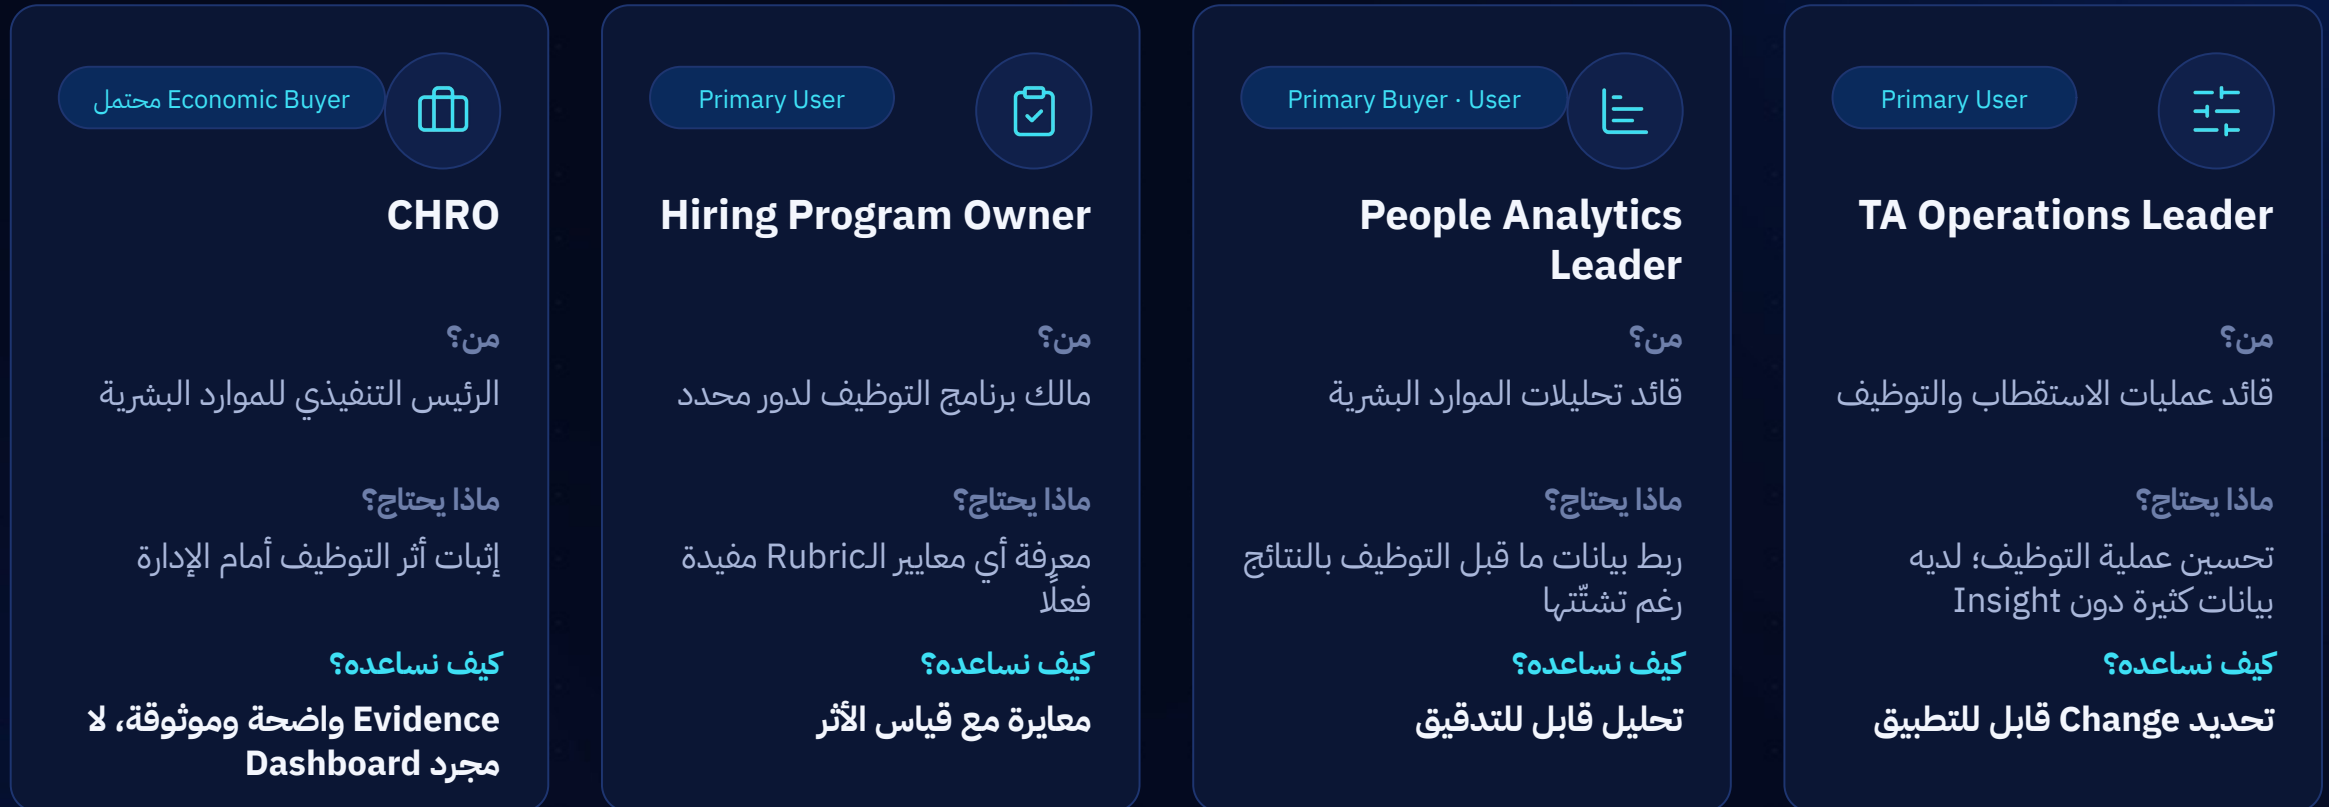

Personas فرضيات أولية من الوثيقة، تُختبر عبر Customer Discovery قبل اعتمادها. أصحاب المصلحة الثانويون: Hiring Managers · HRIS/IT · Compliance.

Hypothesis



ست قدرات تصنع الحلقة

أهم لحظة قيمة: Finding موثق يكشف شيئًا لم يكن واضحًا من قبل — لا مجرد نجاح Parsing.

Evidence Layer



Claim + Source + Context + Confidence + Freshness

القيمة: لا ادعاء دون دليل

Data Intake + Normalization



استيراد CSV آمن، وتوحيد إشارات المقابلة والتقييم.

القيمة: Signals موحدة وقابلة للمقارنة

Role Success Model



تعريف النجاح لكل دور: معايير، مقياس، ونافذة قياس.

القيمة: أساس قابل للمراجعة لكل تحليل

Human Review + History



قبول • رفض • طلب أدلة، مع حفظ حالة قبل/بعد.

القيمة: تغيير مضبوط وقابل للتدقيق

Calibration Engine + Findings



تحليل علاقة Signal بـ Outcome مع الحدود ودرجة الثقة.

القيمة: Finding موثق قابل للتنفيذ

Outcome Mapping



ربط الموظف بنتيجة ما بعد التوظيف ضمن الدور والدفعة.

القيمة: إغلاق الحلقة بين القرار والنتيجة



أين يدخل الـ AI؟

مبدأ أساسي: الـ LLM ليس محرك الإحصاء. سنستخدم Rules و Statistics، و ML فقط حين تكفي البيانات.



Confidence = موثوقية الدليل، لا جودة الشخص

Not Scorable	Low	Medium	High
لا استنتاج	لا تغيير مباشر	تُعرض مع القبول	تُعرض مع Action بعد المراجعة

قواعد غير قابلة للتفاوض

- كل AI Output مؤثر: Structured · Versioned · Validated · Traceable
- لا ادعاء سببي من مجرد Correlation
- بيانات غير كافية = Not Scorable، لا توصية وهمية
- لا قرار توظيف آلي – Human Review إلزامي



النسخة الأولى: NestHire Calibration Audit

1
Decision Owner

1
Primary Outcome

1
Cohort

1
Role

Pilot Unit
دور واحد أو Job Family واحدة، نربط بيانات ما قبل التوظيف
بنتيجة واحدة بعده، ونُخرج Calibration Report موثقًا.

Not Now

Mobile ✕
Marketplace ✕
ATS Replacement ✕
قرارات توظيف آلية ✕
Recruiter Agent عام ✕

أي إضافة تحتاج
Change Request معتمدًا

Later • P1 / P2

ATS/HRIS Connector واحد ○
Monitoring للدفعة التالية ○
Data Quality Dashboard ○
Cohort Comparison ○
Predictive Model ○
Grounded Copilot ○

Must Have • P0

Data Intake

Evidence

Calibration

Human Review

Auditability

Role Success

Signal Registry

Outcome Mapping

Findings

History



المرجعي Technology Stack

مبادئ معمارية

- Modular Monolith أولاً؛ Services فقط عند الحاجة
- مهام الـ AI والمستندات الثقيلة Async عبر Workers
- الملفات خارج PostgreSQL
- كل Endpoint: Auth → Validation → Logic → Audit

Stack مرجعي – يحتاج اعتماداً اليوم

Tailwind

TypeScript

Next.js

الواجهة

Frontend



JWT Auth

Python

FastAPI

الخادم والـ API

Backend



ML

Deterministic Rules

Embeddings

LLM

الذكاء

AI / ML



S3 Storage

Redis + Workers

pgvector

PostgreSQL

البيانات

Data



Observability

CI/CD

GitHub

Docker


البنية والتشغيل

Infrastructure





المقترحة Architecture

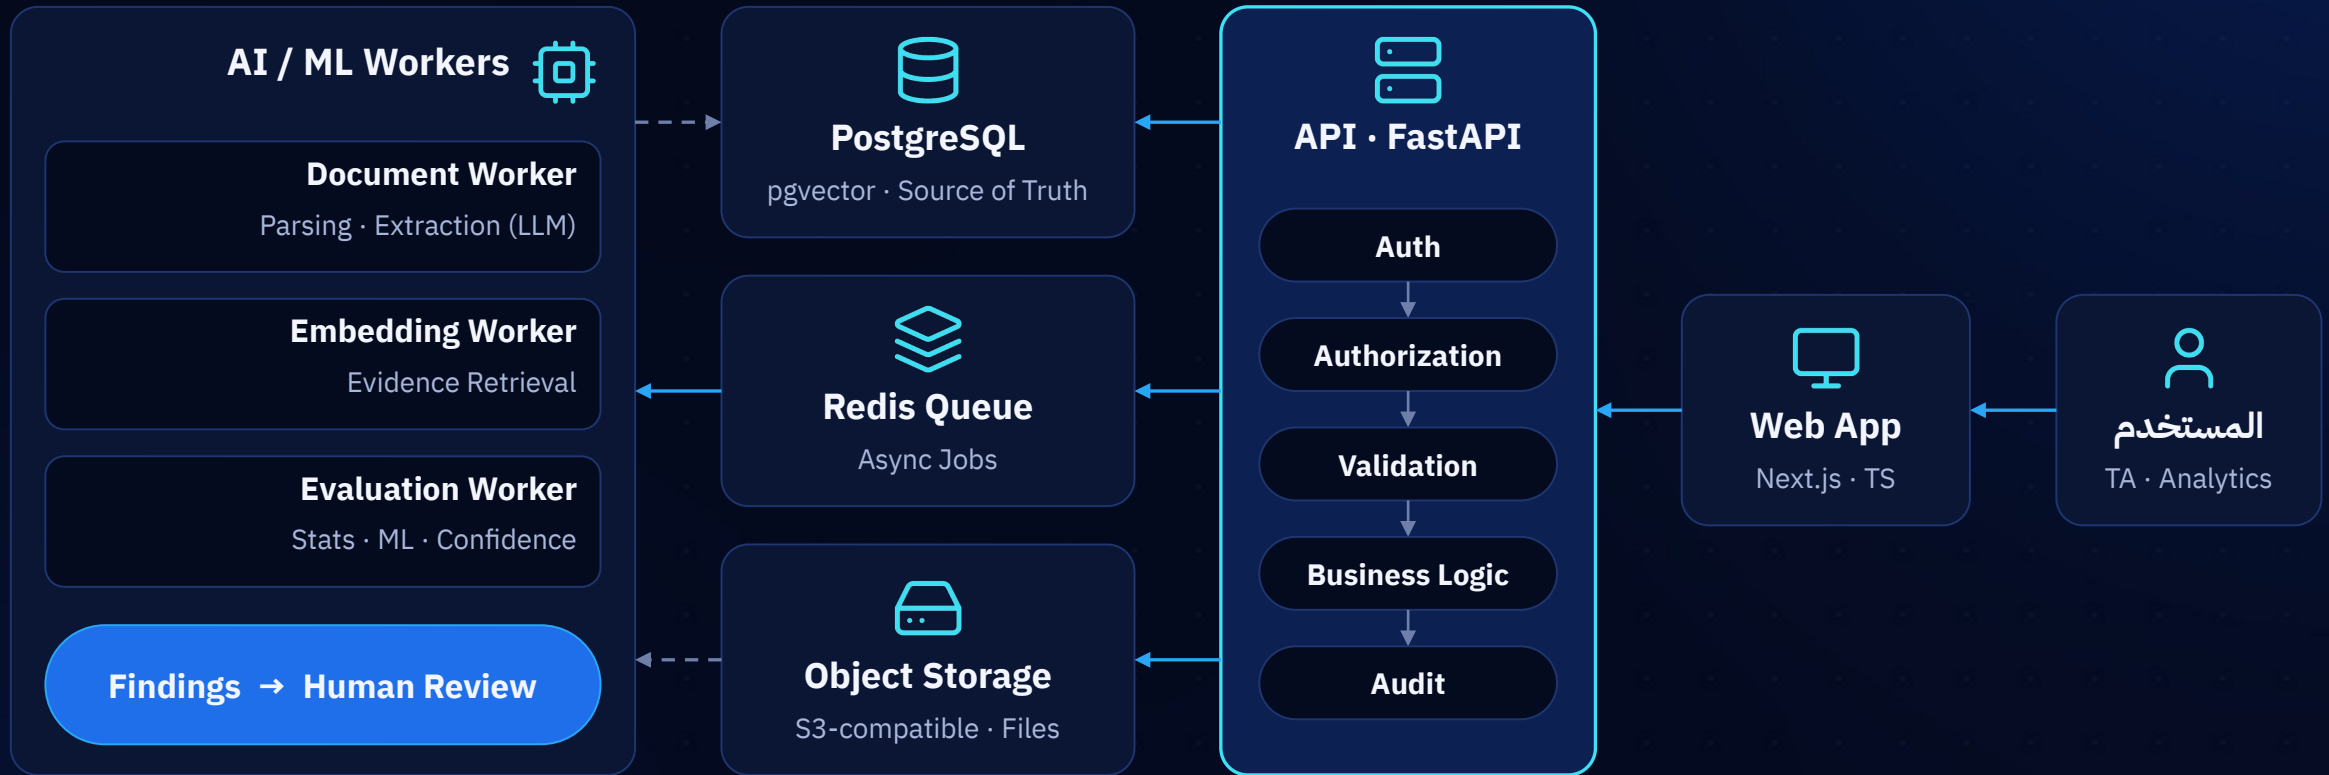

عابرة لكل الطبقات: Tenant Isolation · RBAC · Audit Logs · AI Run Tracing · Observability



الفريق: تسعة أعضاء، ملكية واضحة

فريق AI / ML

إ

إسراء حمد

AI Integration

Workers · Orchestration ·
Tracing

ب

بشار بدوي

ML Engineer

Predictive Gate ·
Evaluation · Drift

أ

أشرف الكحلوت

ML Engineer

Cohorts · Statistics ·
Confidence

ع

عبدالله فسفس

AI Engineering

Parsing · Extraction ·
Evidence components

غ

غسان مقداد

Founder · Team Lead · ML
Engineer · AI Lead

- قيادة المنتج والأولويات
- AI Architecture وسياسة التقييم
- Evidence وتصميم Calibration
- Validation والاعتماد النهائي

الهندسة والتجربة

أ

أحمد الغرابلي

Mobile Developer

Deferred scope · Future
architecture

ج

جنى

UI/UX Designer

Flows · Design System ·
UI States

ع

عمار رمضان

Frontend Engineer

Next.js · Screens · API ·
E2E

ب

براءة النبيه

Backend Engineer

FastAPI · PostgreSQL ·
Auth · Security



من يملك ماذا؟

قاعدة: Owner واحد لكل Task. قد يتعدّد المساهمون، لكن المسؤول النهائي عن التسليم شخص واحد.

العضو • الدور	يملك القرار في	أول Deliverables
غسان مقداد Founder • AI Lead	Product scope • AI semantics • Validation • Final acceptance	Role Success schema • MVP boundaries • Pilot data contract
عبدالله فسفس AI Engineering	تنفيذ مكّونات الـ AI ضمن الـ Contracts المعتمدة	Parsing pipeline • Evidence extraction • Normalization
أشرف الكحلوت ML Engineer	Statistics • Cohort logic • Confidence experiments	Golden dataset v1 • Cohort builder • Data-quality checks
بشار بدوي ML Engineer	Predictive gate • Model comparison • Drift	Evaluation thresholds • Predictive gate policy
إسراء حمد AI Integration	Orchestration • Workers • Observability	Worker orchestration • AI run tracing • Retries
براءة النبيه Backend	API • Database • Auth • Security	Auth + Tenant • PostgreSQL schema • Import APIs • Docker + CI
جنى UI/UX	UX flows • Design system • UI states	Role Calibration flow • Signal Investigation • UI states
عمار رمضان Frontend	تنفيذ الـ Frontend واختباراته	App shell • Role Calibration screen • E2E
أحمد الغرابلي Mobile	نطاق الـ Mobile المؤجّل	Deferred-scope note • Future architecture note



طريقة عمل الفريق

لا يدخل أي طلب جديد إلى الكود مباشرة؛ يتحوّل أولاً إلى Task لها Owner واحد ومعايير قبول واضحة.



قواعد العمل

- لا كود قبل Contract ومعايير قبول واضحة
- أي تغيير جوهري = Change Request
- Done = Tests + Docs + Review + Staging

إيقاع الفريق

- يوميًا: Done · In Progress · Blocked · Next
- 2-3 مرات أسبوعيًا: AI/Engineering sync
- أسبوعيًا: مراجعة + AI + Product Engineering

GitHub

- Issue لكل Task بمعرّف مثل BE-001
- Branch لكل Task
- Pull Request مع Reviewer واضح
- docs/product · docs/ai · docs/api

قرار اليوم: تسمية الBranches وقالب الPR



خارطة الطريق إلى Pilot الأول





أول مهمة لكل عضو – تبدأ الآن

الموعد: يُحدّد اليوم

ع عبدالله فسفس

Parsing + Structured evidence extraction

شرط الخروج: أمثلة Golden تجتاز baseline

الموعد: يُحدّد اليوم

ب براءة النبيه

Auth + Tenant + DB skeleton + Import foundation

شرط الخروج: API + migrations + tests تعمل

الموعد: يُحدّد اليوم

غ غسان مقداد

MVP + Role Success + Data contract

شرط الخروج: Contracts موثقة ومعتمدة

الموعد: يُحدّد اليوم

إ إسماء حمد

AI worker orchestration + Tracing

شرط الخروج: Async job trace ظاهر

الموعد: يُحدّد اليوم

ب بشار بدوي

Evaluation thresholds + Predictive gate policy

شرط الخروج: سياسة مراجعة وموثقة

الموعد: يُحدّد اليوم

أ أشرف الكحلوت

Golden dataset + Cohort/Data-quality foundation

شرط الخروج: Dataset + baseline metrics

الموعد: يُحدّد اليوم

أ أحمد الغرابلي

مذكرة نطاق Mobile المؤجل فقط

شرط الخروج: Deferred scope موثق

الموعد: يُحدّد اليوم

ع عمار رمضان

Calibration + App shell

شرط الخروج: شاشة متصلة بالAPI

الموعد: يُحدّد اليوم

ج جنى

UX: Role Calibration + Signal Investigation

شرط الخروج: Prototype معتمد



ما الذي نحسمه اليوم؟

تبقى مفتوحة – لا نخترع إجابتها

- أول ICP وأول Role نبدأ به Pilot
- أول Outcome سنقيسه
- الحد الأدنى لحجم Cohort
- التسعير والاستعداد للدفع
- أول ATS/HRIS Connector بعد CSV

تُحسم عبر **Customer Discovery** و**Pilot**، لا بالرأي.

نحسمها اليوم · Decisions Required

- 01 ☐ الاسم والهوية: NestHire أم Nest Hire؟ واعتماد الهوية البصرية
- 02 ☐ تجميد نطاق MVP وتصنيف الخصائص: P0 · P1 · Not Now
- 03 ☐ اعتماد Technology Stack المرجعي
- 04 ☐ اعتماد Architecture: Modular Monolith أولاً
- 05 ☐ تأكيد الأدوار وتعيين Owner لكل مهمة
- 06 ☐ GitHub Workflow: تسمية Branches · قالب PR · المراجعون
- 07 ☐ Timeline: مدة Sprint وموعد كل مهمة أولى
- 08 ☐ آلية المتابعة: التحديث اليومي والمراجعة الأسبوعية



لنبدأ البناء.

Let's Build It.

نظام توظيف يتعلّم من الأدلة والنتائج... ويتحسّن مع كل دفعة.

ما أول خطوة؟

مهمتك الأولى بموعد يُحدّد اليوم

ما دوري؟

شريحتا الفريق وتوزيع المسؤوليات

لماذا نبنيه؟

لأن إشارات التوظيف لا تُختبر مقابل النتائج

ماذا نبني؟

Hiring Decision Calibration Engine
